

# 新本庁舎・消防庁舎建設だより

## ■ 工事の進捗状況

庁舎棟、訓練塔共に外部足場の撤去が進み、国道から外観が見えてきました。

これまで、令和 3 年 3 月 18 日を工期として建設を進めてまいりましたが、工事現場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策や積雪の影響により、工期を約 1 カ月後の令和 3 年 4 月 26 日に変更することとなりました。


新庁舎の供用開始は当初の計画どおり 5 月中旬と変更はありませんが、工事期間が延びることに伴い、行政区の皆様には大変ご迷惑をおかけいたします。

引き続き安全管理を徹底してまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。



【2月22日撮影】

## ■ 2月の作業風景

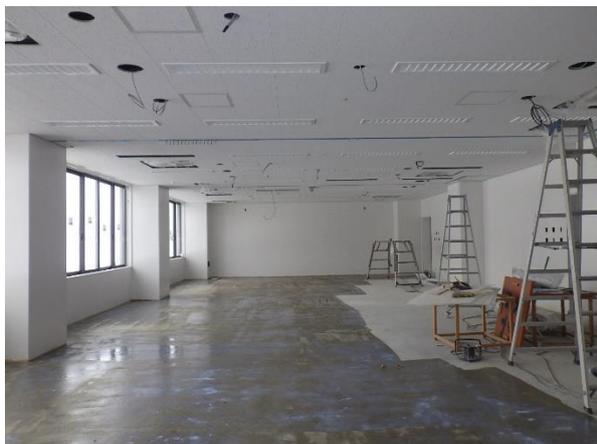

災害対策室兼議場兼講堂



消防署事務室



主訓練塔



副訓練塔

## ■ 3月の工事予定

建築主体工事	庁舎棟	内装工事、造り付家具取付
	庁舎外部	防水工事、サイン設置
	訓練塔	塗床工事
	外構	排水溝・縁石設置、路盤工事
電気設備工事	試運転調整	
機械設備工事	試運転調整	

### 喜多方地方広域市町村圏組合

(構成市町村 喜多方市／北塩原村／西会津町)

事務担当：消防本部総務課

電話番号：0241-22-6212
