

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

[規4条の5の2第1号イ、規4条の7第2号イ]

	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃やせるごみ（1号炉）	(t/月)	677	573	639										1,888
燃やせるごみ（2号炉）	(t/月)	671	626	659										1,957
合計		1,348	1,199	1,298										3,845

2. 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（連続測定記録）

[規4条の5の2第1号ロ、規4条の7第2号イ]

項 目	燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度
測 定 位 置	別紙 採取位置 参照
測定結果が得られた日	連続測定記録についてはインターネットで公表することが難しいため、資料を現地施設に取り揃えてあります。
測 定 結 果	

3. ばいじん除去の実施状況

[規4条の5の2第1号ハ、規4条の7第1号ハ]

実施年月日	実施箇所	
6月8日～6月9日	1号炉	減温用熱交換器、空気予熱用熱交換器
6月9日～6月10日	2号炉	減温用熱交換器、空気予熱用熱交換器
	1号炉	
	2号炉	
	1号炉	
	2号炉	


4. 排ガスの分析結果（年に1回以上又は6カ月に1回以上）

[規4条の5の2第1号ニ、規4条の7第1号ニ]

採取位置			別紙 採取地点 参照											
採 取 年 月 日														
測 定 結 果 の 得 ら れ た 日	ばいじん等	6月11日						6月11日						
	ダイオキシン類													
測定項目	単位	基準値	1号炉					2号炉						
年に1回以上														
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm ³	5												
6カ月に1回以上														
ばいじん	g/m ³ N	0.15	0.0051					0.0037						
硫黄酸化物排出量	(m ³ N/h)	—	0.12					0.065						
硫黄酸化物基準値	(m ³ N/h)	測定ごとに算出	81					79						
窒素酸化物	ppm	250	84					89						
塩化水素	mg/Nm ³	700	8.6					17						



別紙 1 採取位置

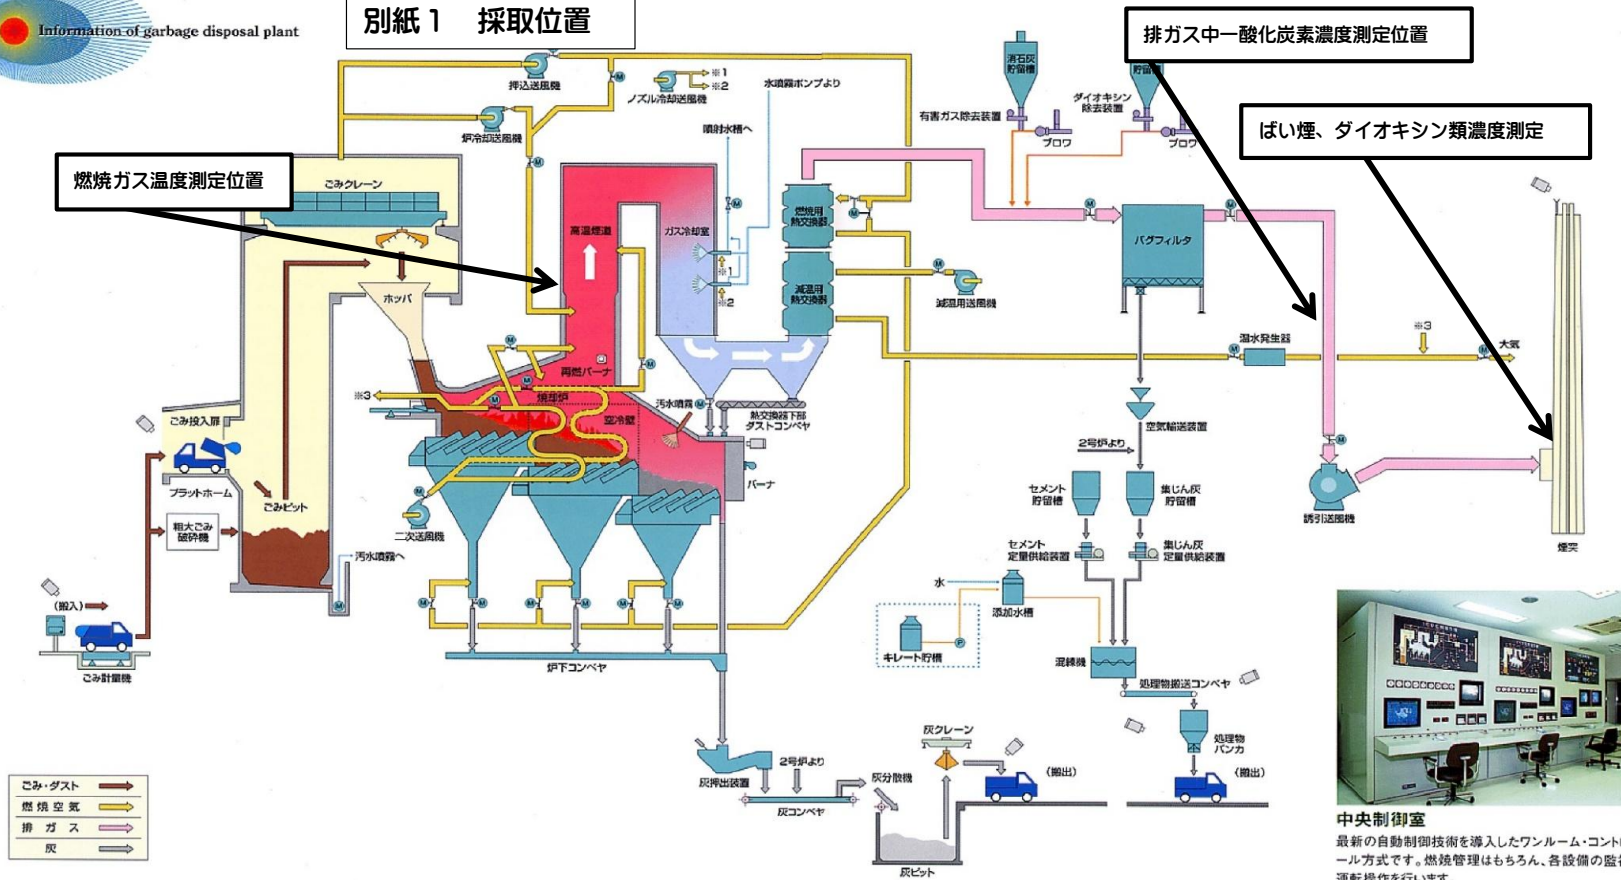

ゴミの流れ

搬入された可燃ごみは、計量後直接ごみピットに投入されます。ごみピットに貯留された可燃ごみは、ごみクレーンで撚拌後ホッパに投入されます。ホッパに投入されたごみは、給じん装置により定量的に焼却炉のストーカ上に供給され、反転・撚拌を繰り返しながら乾燥・燃焼し完全に焼却されます。

灰の流れ

完全燃焼後の灰は、炉下コンベヤ・灰コンベヤを経て灰ピットに送られます。灰ピットに貯留された灰は、ダスト固化物とともに灰クレーンで灰搬出車に積み込まれ、最終処分場へ搬出されます。

空気の流れ

燃焼用空気は、ごみピットより押込送風機によって吸引され、燃焼用空気予熱器で予熱された後、炉下から炉内へ供給され、ごみの乾燥・燃焼に使用されます。二次燃焼用空気は、専用の送風機とノズルによって高速で炉出口に吹き込まれ、燃焼ガスと二次燃焼空気を効率よく撚拌し完全燃焼を行います。

排ガスの流れ

ごみの燃焼により発生した排ガスは、ガス冷却室・燃焼用空気予熱器および減温用熱交換器を経た後、消石灰と活性炭噴霧により有害成分が吸着・除去されます。バグフィルタでは、排ガス中のダストを除去すると同時に、有害ガス処理によって生じた副生成物（重金属及びダイオキシン類等）が捕集・除去されます。処理された排ガスは、誘引送風機により吸引され、煙突から大気中に放散されます。

飛灰の流れ

排ガスに含まれるダスト（飛灰）はバグフィルタで捕集され、重金属及びダイオキシン類等の溶出を防ぐため混練機でセメント・キレート溶液と混練されます。

1. 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

[規4条の5の2第1号イ、規4条の7第2号イ]

単位：トン

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
(焼却灰、灰固形化物、不燃物等)													0.00

2. 点検状況

[規4条の5の2第1号ロ、規4条の7第2号イ]

項目	点検を行った日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
擁壁の点検	点検を行った結果												
	異常の有無	無	無	無									
	損壊する恐れがある場合の措置	措置を講じた日											
		措置の内容											
遮水シートの点検	点検を行った結果												
	異常の有無	無	無	無									
	遮水効果低下の恐れがある場合の措置	措置を講じた日											
		措置の内容											
調整池の点検	点検を行った結果												
	異常の有無	無	無	無									
	損壊する恐れがある場合の措置	措置を講じた日											
		措置の内容											
進出水処理施設の点検	点検を行った結果												
	異常の有無	無	無	無									
	異常が認められた場合の措置	措置を講じた日											
		措置の内容											
導水管等の防凍措置の点検	点検を行った結果												
	異常の有無	無	無	無									
	異常が認められた場合の措置	措置を講じた日											
		措置の内容											

3. 水質検査の実施状況 別紙のとおり

[規4条の5の2第1号ロ、規4条の7第2号イ]

4. 採取処分場の残余容量

測定日	令和7年8月
残余容量	11,225㎡

1 地下水の水質検査結果（上流）

令和8年度

[illegible]

2 地下水の水質検査結果（下流）

令和8年度

[illegible]

3 放流水の水質検査結果

令和8年度

[illegible]
